LE THOLONET

AMENAGEMENT ENTREE DE VILLE

CALENDRIER PREVISIONNEL
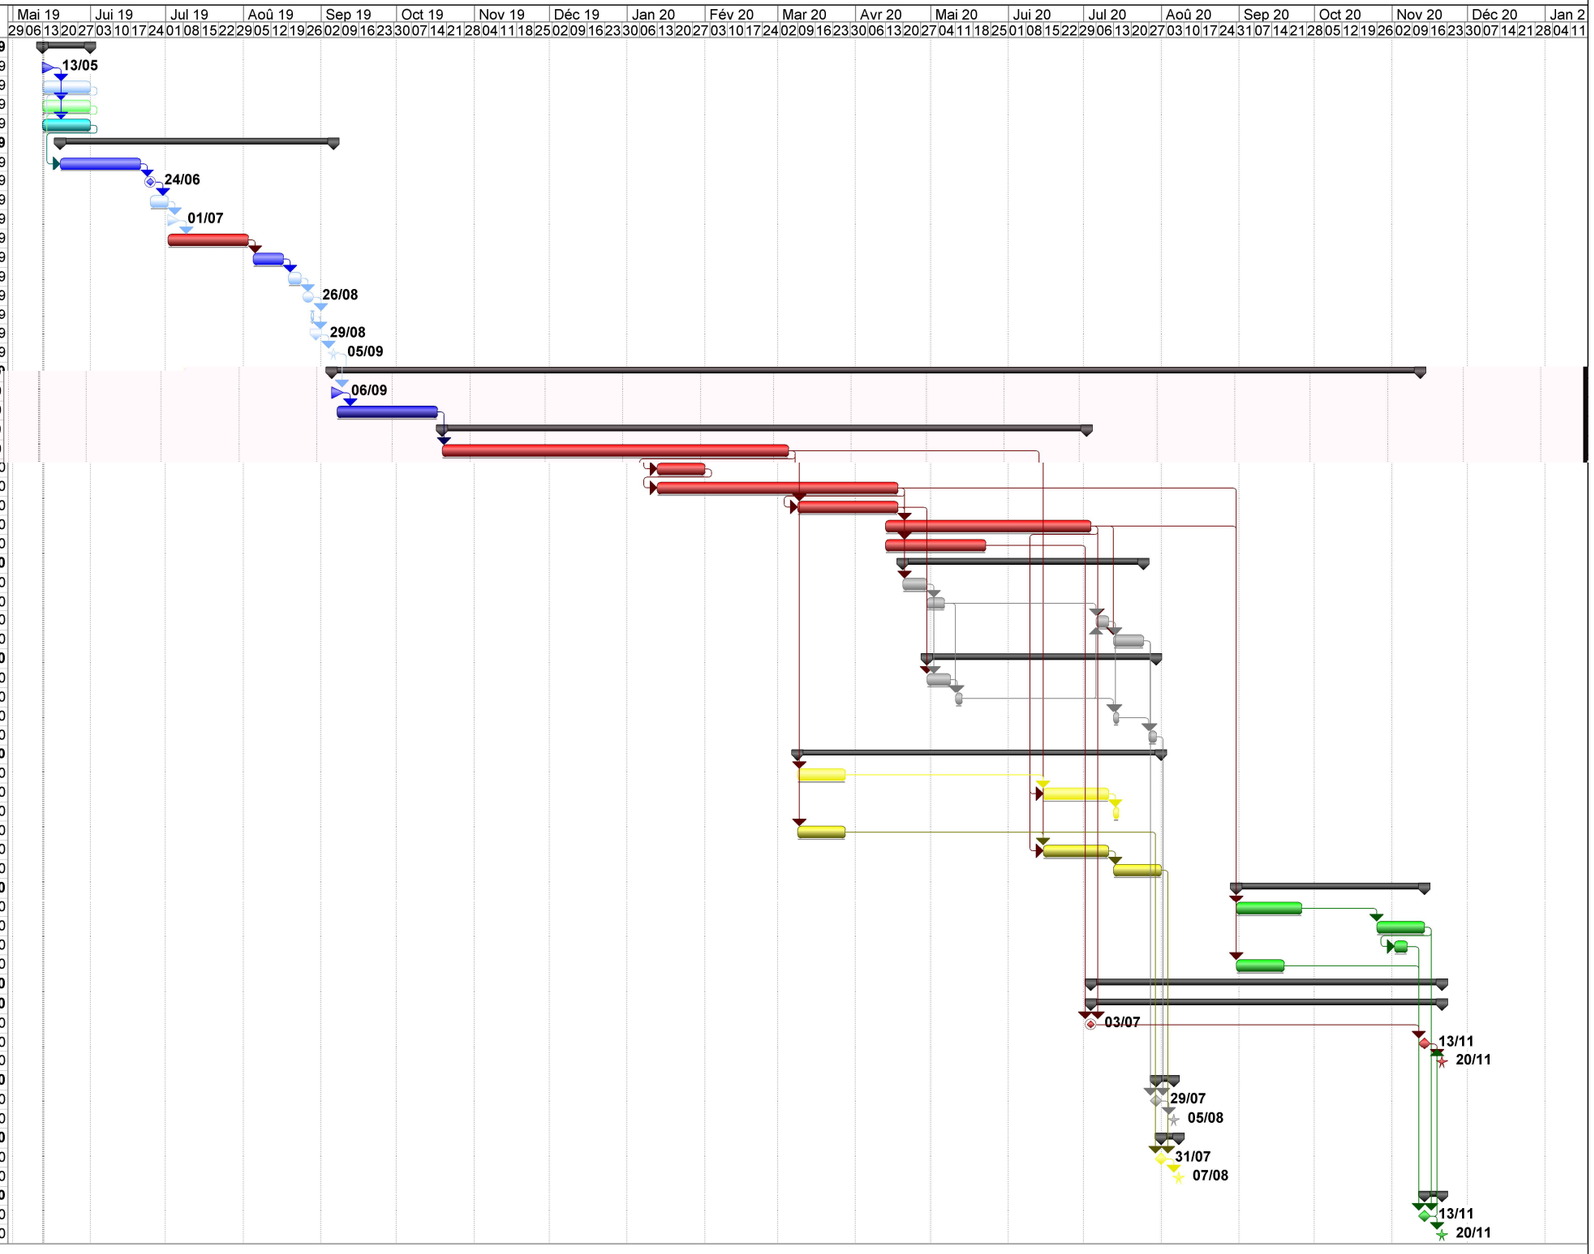
N°	Nom de la tâche	Durée	Début
1	**ETUDES DE PROJET**	**15 jours**	**Lun 13/05/19**
2	Remise des études	0 jour	Lun 13/05/19
3	Analyse par MOA	15 jours	Lun 13/05/19
4	Analyse par Metropole	15 jours	Lun 13/05/19
5	Analyse par CD13	15 jours	Lun 13/05/19
6	**ASSISTANCE AUX CONTRATS DE TRAVAUX**	**79 jours**	**Lun 20/05/19**
7	Elaboration du Dossier de Consultation des Entreprises	1,2 mois	Lun 20/05/19
8	Réunion de présentation	0 jour	Lun 24/06/19
9	Délai de validation	5 jours	Mar 25/06/19
10	Engagement de la consultation	0 jour	Lun 01/07/19
11	Rédaction des offres	1,2 mois	Mar 02/07/19
12	Analyse des offres	2 sm	Lun 05/08/19
13	Négociations	1 sm	Lun 19/08/19
14	Choix du lauréat	0 jour	Lun 26/08/19
15	Mise au point du marché	1 jour	Mer 28/08/19
16	Conseil Municipal	0 jour	Jeu 29/08/19
17	Notification du marché de travaux	0 jour	Jeu 05/09/19
18	DIRECTION DE L'EXECUTION DES TRAVAUX	340 jours	Ven 06/09/19
19	Ordre de service de démarrage des études d'execution LOTS 01 à 04	0 jour	Ven 06/09/19
20	Période de préparation, installations de chantier	1,5 mois	Lun 09/09/19
21	**Ordre de service de démarrage des travaux LOT 01**	**185 jours**	**Lun 21/10/19**
22	Travaux sur les réseaux	5 mois	Lun 21/10/19
23	Démolitions diverses	3 sm	Lun 13/01/20
24	Maconneries	3,5 mois	Lun 13/01/20
25	Bordures	1,5 mois	Lun 09/03/20
26	Revêtements	3 mois	Lun 13/04/20
27	Equipements (fontaine, toilettes, …)	1,5 mois	Lun 13/04/20
28	**Ordre de service démarrage des travaux LOT 02 - Tranche Ferme**	**70 jours**	**Lun 20/04/20**
29	Rabottages	1,5 sm	Lun 20/04/20
30	Mises à la cote	1 sm	Mer 29/04/20
31	Enrobés	5 jours	Lun 06/07/20
32	Signalisation verticale et horizontale	10 jours	Lun 13/07/20
33	**Ordre de service démarrage des travaux LOT 02 - Tranche Optionnelle**	**65,5 jours**	**Mer 29/04/20**
34	Rabottages	1,5 sm	Mer 29/04/20
35	Mises à la cote	0,5 sm	Lun 11/05/20
36	Enrobés	2 jours	Lun 13/07/20
37	Signalisation verticale et horizontale	3 jours	Lun 27/07/20
38	**Ordre de service démarrage des travaux LOT 03**	**105 jours**	**Lun 09/03/20**
39	Câblage "Eclairage Public"	3 sm	Lun 09/03/20
40	Mise en place des équipements "Eclairage Public"	4 sm	Lun 15/06/20
41	Essais Eclairage public	2 jours	Lun 13/07/20
42	Câblage "SLT"	15 jours	Lun 09/03/20
43	Mise en place des équipements "SLT"	1 mois	Lun 15/06/20
44	Essais SLT	3 sm	Lun 13/07/20
45	**Ordre de service démarrage des travaux LOT 04**	**55 jours**	**Lun 31/08/20**
46	Préparations de sols	4 sm	Lun 31/08/20
47	Plantations	3 sm	Lun 26/10/20
48	Arrosage et programmation	1 sm	Lun 02/11/20
49	Petite maconnerie	3 sm	Lun 31/08/20
50	**ASSISTANCE AUX OPERATIONS DE RECEPTION**	**100 jours**	**Ven 03/07/20**
51	**LOT 01**	**100 jours**	**Ven 03/07/20**
52	OPR avec réserves sur "Repli des installations Chantier"	0 jour	Ven 03/07/20
53	OPR Levée de réserves	0 jour	Ven 13/11/20
54	PV Réception	0 jour	Ven 20/11/20
55	**LOT 02 - TF+TO**	**5 jours**	**Mer 29/07/20**
56	OPR	0 jour	Mer 29/07/20
57	PV Réception	0 jour	Mer 05/08/20
58	**LOT 03**	**5 jours**	**Ven 31/07/20**
59	OPR	0 jour	Ven 31/07/20
60	PV Réception	0 jour	Ven 07/08/20
61	**LOT 04**	**5 jours**	**Ven 13/11/20**
62	OPR	0 jour	Ven 13/11/20
63	PV Réception	0 jour	Ven 20/11/20
